



位置図

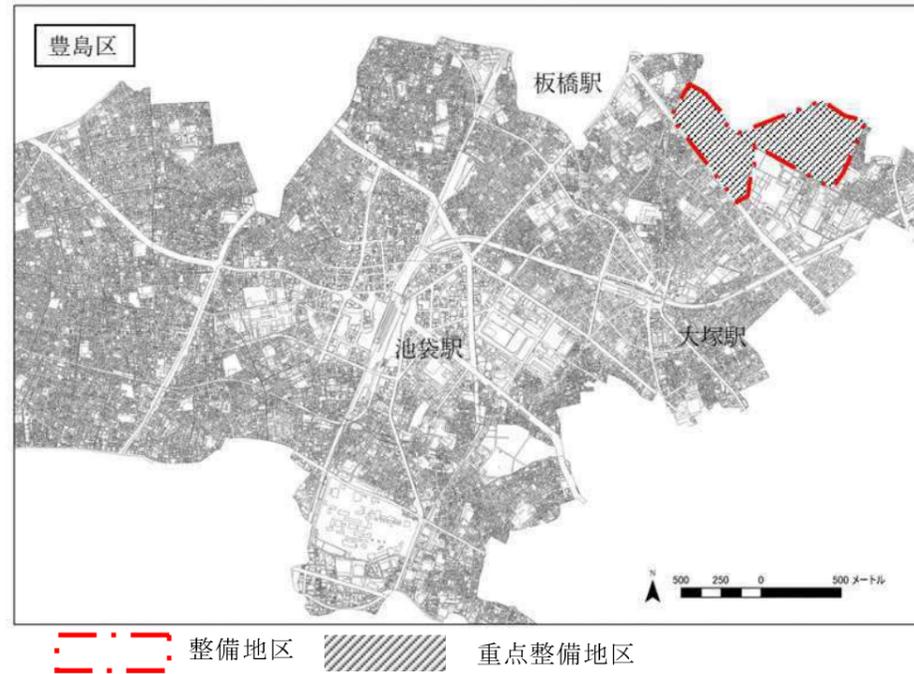

事業内容を示す図面

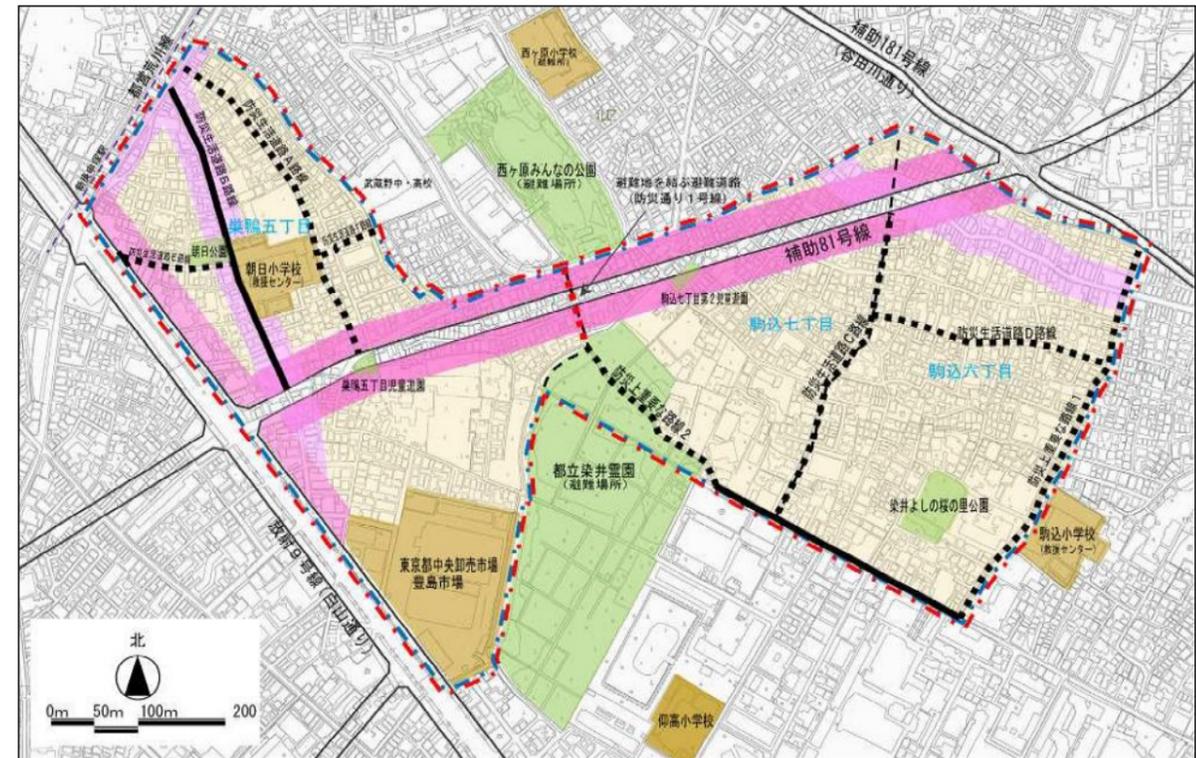

事業概要

対象項目	現行計画 (見直し前)			見直し案		
	整備計画内容 (A)	実績 令和6年度末時点 (B)	進捗率 (B/A)	整備計画内容 (A')	増減 (A' - A)	
道路	取得	4,007㎡	224㎡	6%	3,742㎡	▲265㎡
	整備	10,019㎡	0㎡	0%	10,284㎡	+265㎡
細街路	整備	500㎡	345㎡	69%	500㎡	±0㎡
公園 緑地 広場	取得	420㎡	268㎡	64%	1,850㎡	+1,430㎡
	整備	600㎡	0㎡	0%	2,030㎡	+1,430㎡

見直し概要

- 公園用地の整備  
既存の二つの児童遊園は、用地拡張を進めるほか、新たに代替地となる公園用地の取得に取り組む。
- 道路 (防災生活道路) 整備  
防災生活道路の整備は、計画通りとし数量を精査した。都立染井霊園と北区西ヶ原みんなの公園の避難地を結ぶ避難道路である防災通り1号線の用地取得と整備を進める。
- 細街路 (狭あい道路) 整備  
細街路の整備は、実績を踏まえ、見直しを行わず計画通り整備を進める。

凡例

- 整備地区 (Red dashed line)
- 重点整備地区 (Blue dashed line)
- 幹線沿道地区 (Pink solid line)
- 近隣商業施設 (Yellow solid line)
- 一般住宅地区 (Light yellow solid line)
- 防災生活道路 (整備済み) (Black solid line)
- 防災生活道路 (未整備・優先整備路線) (Red dashed line)
- 防災生活道路 (未整備) (Black dashed line)
- 公園・広場 (未整備) (Green circle)
- 公園等 (本事業で整備済み) (Green solid line)
- 公園等 (整備済み) (Light green solid line)
- 公共施設等 (Brown solid line)

事業の種類	密集市街地総合防災事業
事業の名称	補助81号線沿道地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	密集市街地総合防災事業 採択後5年
対応方針 (案)	継続・中止

事業内容を示す図面及び写真



写真① 避難地を結ぶ避難道路（防災通り1号線）  
※南側より撮影  
染井霊園と西ヶ原みんなの公園を結ぶ。



写真② 避難地を結ぶ避難道路（防災通り1号線）  
※北側より撮影  
染井霊園と西ヶ原みんなの公園を結ぶ。




写真③ 巢鴨五丁目児童遊園  
令和6年度一部拡幅。



写真④ 駒込七丁目第2児童遊園



写真⑤ 狭あい道路・坂道（駒込六丁目）

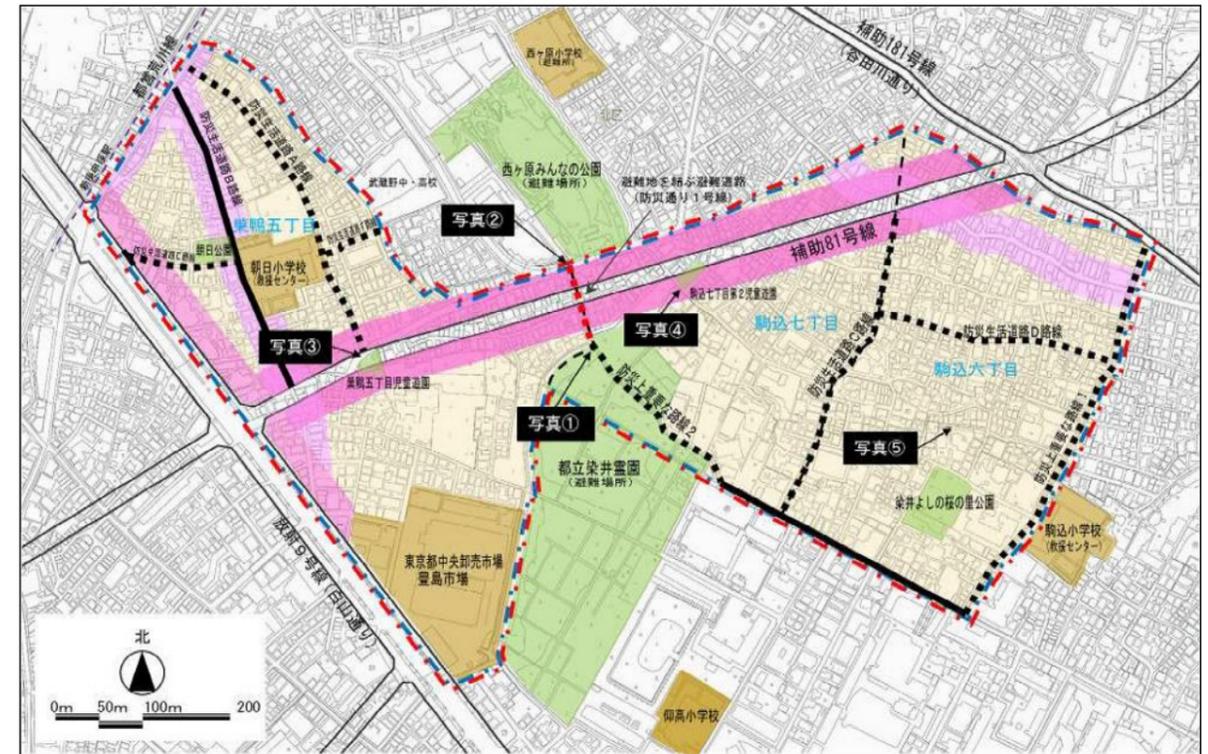

凡例					
	整備地区		防災生活道路(整備済み)		公園等(本事業で整備済み)
	重点整備地区		防災生活道路(未整備・優先整備路線)		公園等(整備済み)
	幹線沿道地区		防災生活道路(未整備)		公共施設等
	近隣商業施設		公園・広場(未整備)		
	一般住宅地区				

事業の種類	密集市街地総合防災事業
事業の名称	補助81号線沿道地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	密集市街地防災事業 採択後5年
対応方針(案)	継続中止
