


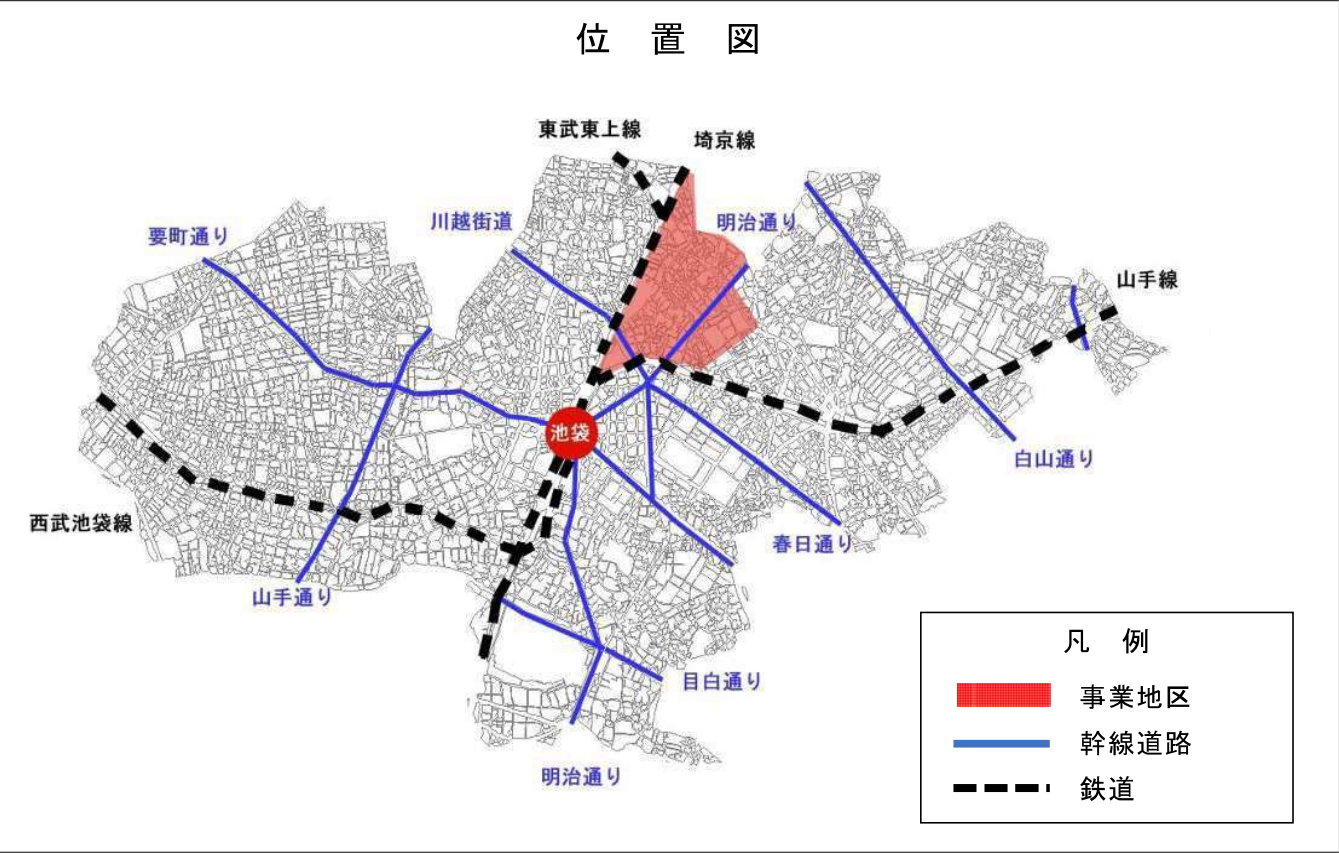


事業概要

対象項目		現行計画（見直し前）			見直し案	
		整備計画内容（A）	実績 令和6年度末時点（B）	進捗率（B／A）	整備計画内容（A'）	増減（A'－A）
道路	取得	904.49㎡	292.48㎡	32%	807.52㎡	▲96.97㎡
	整備	3,183.00㎡	1,330.00㎡	42%	3,184.00㎡	+1.00㎡
細街路	整備	3,753.72㎡	3,070.95㎡	82%	3,753.72㎡	±0㎡
公園緑地 広場	取得	8,635.27㎡	7,622.13㎡	88%	8,622.13㎡	▲13.14㎡
	整備	8,487.45㎡	6,461.16㎡	76%	7,461.16㎡	▲1,026.29㎡

- 見直し概要
- 事業延伸に伴う整備内容の見直しはせず、令和２年度から令和６年度で実施できなかった残事業に取り組んでいく。

今後６年間に於いて、防災生活道路６路線（Ａ、Ｂ１～Ｂ５路線）の内、Ｂ１路線（の一部約200m）、Ｂ４路線（の未整備部分約140m）の２路線を優先して、用地買収を主とした公共整備型の事業を進め、令和１２年度の完了を目指す。

公園を２ヶ所整備する。

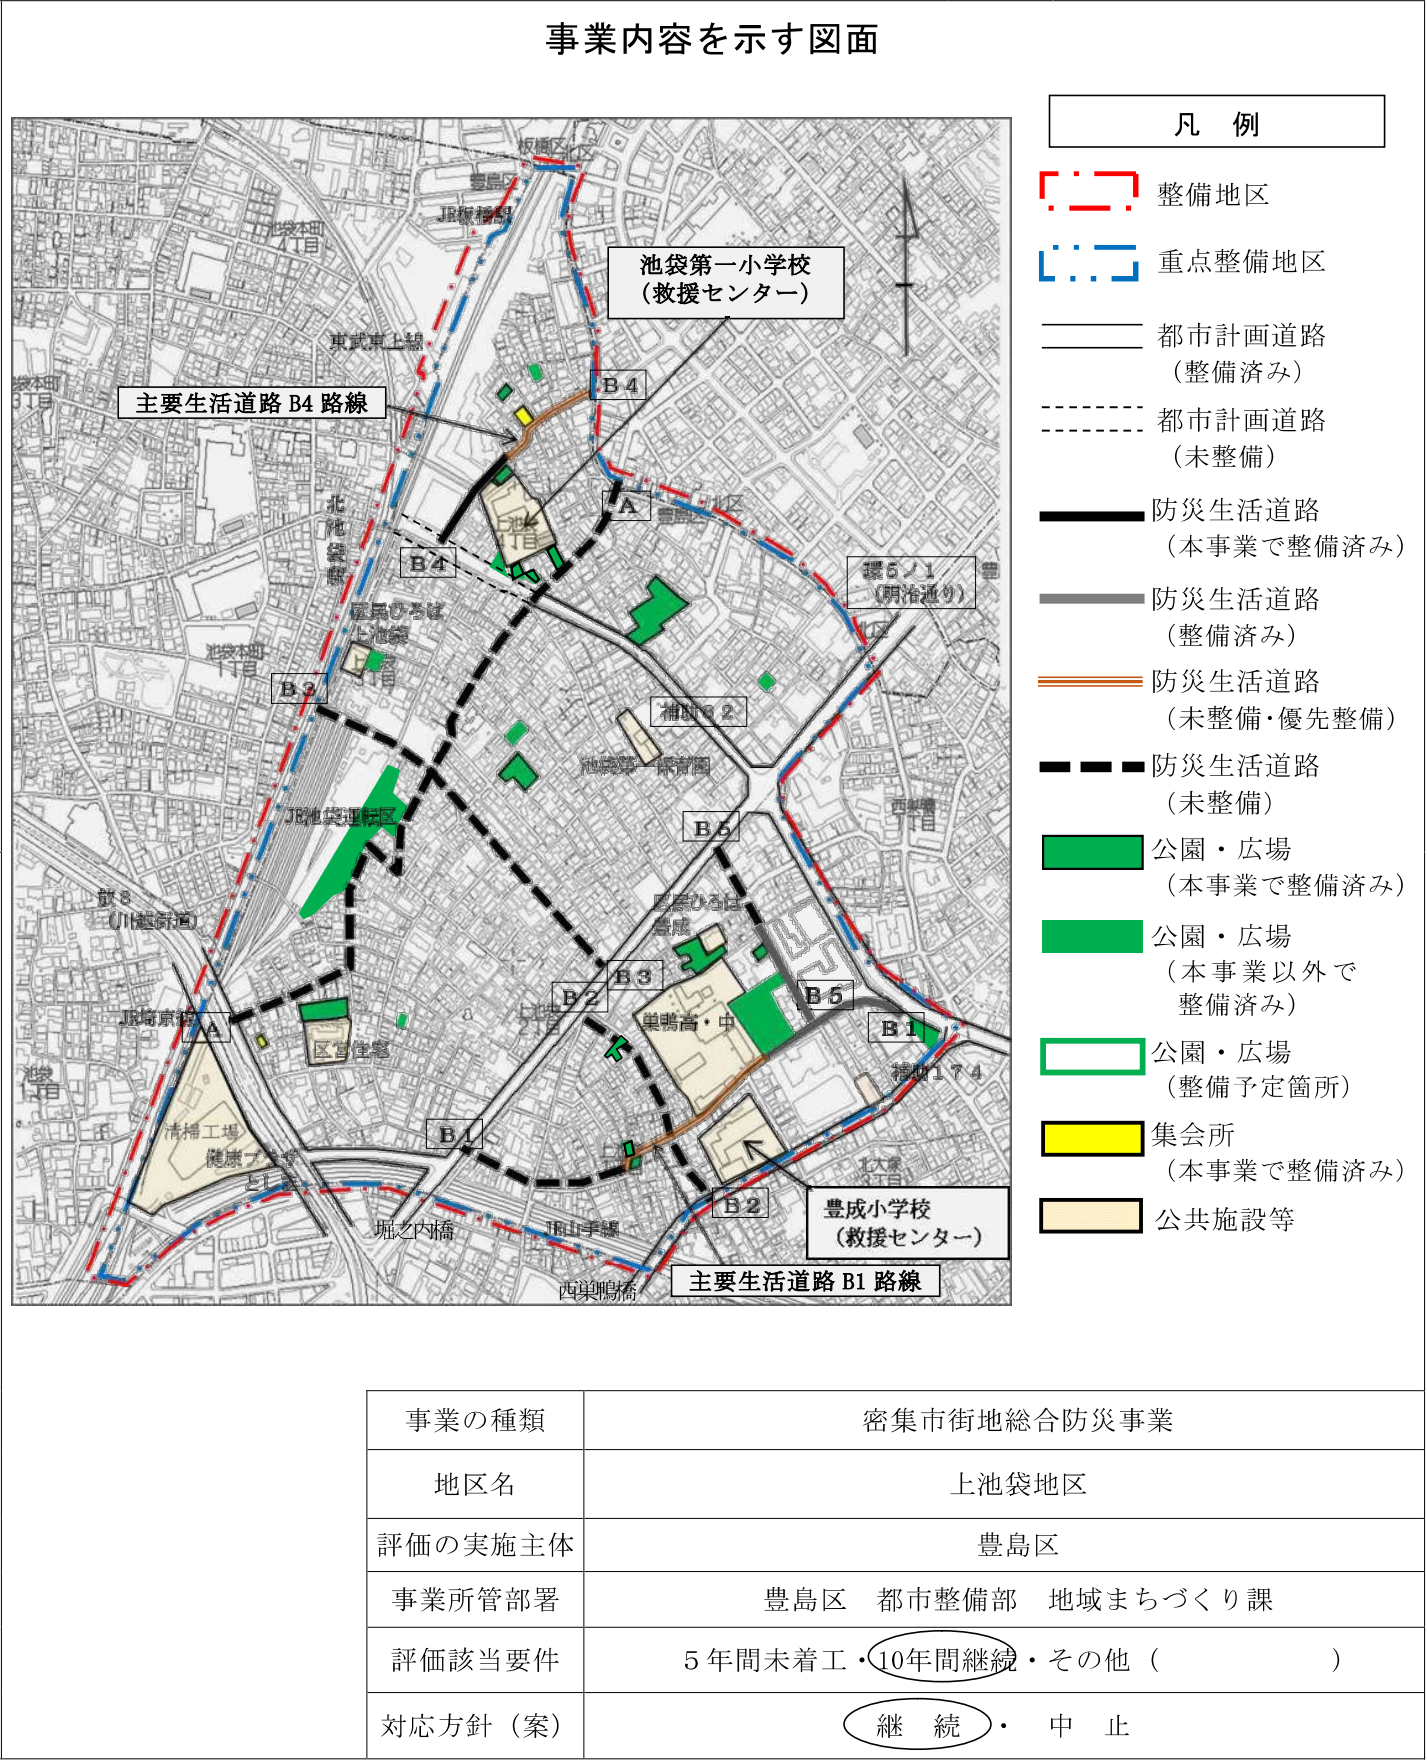

事業内容を示す図面



← 写真①
主要生活道路B4路線
整備済み区間

平成16年度

民間大規模マンション
開発と連携して区道を
付け替え、幅員8mの
道路として整備



← 写真②
主要生活道路B4路線の
一部拡幅

令和6年度

幅員 2.4m～3.6m程度の
道路が続く。(写真右拡幅
部分 54.05 m²)



← 写真③
主要生活道路B4路線
沿道の後背地にお
ける用地取得箇所

平成28年度

用地取得(178 m²)



← 写真④
補助82号線から救援
センター（池袋第一
小学校）につながる
沿道の整備

令和4年度

学校改築に伴う沿道
整備



← 写真⑤
主要生活道路B1路線
の未拡幅の部分


幅員 3.6m前後の道路
が続く。



← 写真⑥
主要生活道路B1路線の未拡幅の部分

平成28年度

学校改築に伴う沿道整備により幅員5mまで整備

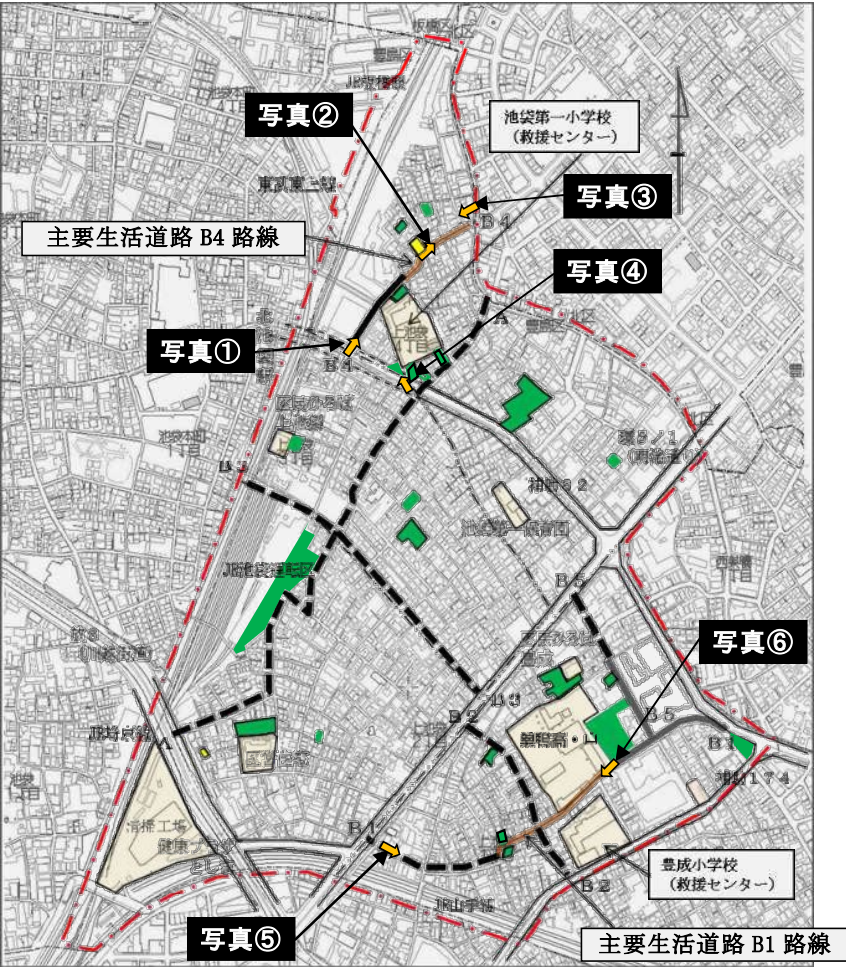

事業の種類	密集市街地総合防災事業
地区名	上池袋地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	5年間未着工・10年間継続、その他（ ）
対応方針（案）	継続・中止
